

19

6v

Név:

Hely:

szám

Kiskunhalas - Baja

AR" konténer kp.-ok.

megvalósításának

ütem terve.

Gyorsfűző
MSZ 5618

PAPÍRIPARI VÁLLALAT



KISKUNHALASI GYÁRA

1978 - 79 év.

Szegedi Postaigazgatóság
10. Beruházási Osztály

Tervén felüli fejlesztések keretében megvalósuló
bajai és kiskunhalasi konténerközpontok beruházási tevékenységének

ü t e m t e r v e

Összeállította:

Honti Ferenc

Felülvizsgálta:

Vojnár László
osztályvezető

Egyetért:

Fábián Pál
igazgatóhelyettes

Jóváhagyta:

Rózsa István
igazgató

S z e g e d , 1978. június hó

T a r t a l o m

- I. A beruházás alapadatai
- II. A beruházás lebonyolításában közreműködő szervezeti apparátus felépítése
- III. A beruházás és üzembehelyezési tevékenység ütemezése
- IV. Szervezeti egységekre lebontott feladatterv
- V. Alaprajz és kapcsolási rajzok

Szegedi Postaigazgatóság

10. Beruházási Osztály

A bajai és kiskunhalasi konténerközpontok és kapcsolódó létesít-
mények megvalósításának és üzembehelyezésének ütemterve.

A beruházás a Magyar Posta terven felüli állóeszközfejlesztésének a keretében valósul meg, ennek következtében mind az előkészítésre mind a tényleges megvalósításra fokozott gondot kell fordítani, annak érdekében, hogy a Postavezérigazgatóság által meghatározott határidőre az üzembehelyezés megtörténjen.

A fentiek zavartalan és meghatározott időben történő végrehajtá-
sához a következő szervek magasszintű együttműködését kell meg-
valósítani:

1./ Szegedi Postaigazgatóság:

- 10. Beruházási Osztály
- 8. Távközlési Műszaki Osztály
- 9. Távközlési Forgalmi Osztály
- 11. Építési Osztály
- Csongrád megyei Távközlési Üzem
- Bács-Kiskun megyei Távközlési Üzem
- Hálózatépítő Üzem
- Magasépítési Üzem
- Területi Tervező Iroda

2./ Postai Tervező Intézet

3./ Posta Központi Javitó Üzem

4./ BHG Híradástechnikai Vállalat

5./ Helyközi Távbeszélő Igazgatóság

A beruházás alapadatai:

Megnevezése, telepítési helye:

Bajai és Kiskunhalasi konténerközpontok, valamint kapcsolódó helyi hálózat és alközponti rekonstrukció.

Baja: A telepítési hely meghatározása folyamatban !

Kiskunhalas: Lenin tér 1801-u ingatlan

A beruházás tárgya:

Baja: 2 db ARF 102. rendszerű konténerbe szerelt helyi távbeszélőközpont létesítése, összesen 1800 állomáskapacitással, 10 db, helyközi munkahely telepítése, és kapcsolódó helyi hálózat ill. alközponti rekonstrukció.

Kiskunhalas: 1 db ARF rendszerű konténerbe szerelt távbeszélőközpont telepítése 900 állomáskapacitással, 8 db. helyközi munkahely létesítése, és kapcsolódó helyi hálózat, ill. alközponti rekonstrukciók.

A BERUHÁZÁS SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ LÉTESÍTMÉNYEK JEGYZÉKE ÉS GÉPLISTA

1./ Baja

<u>Megnevezés</u>	<u>m.egys.</u>	<u>menny.</u>	<u>költs.e/Ft</u>
<u>Belföldi gép</u>			
2 db ARF 102 konténer központ	áll.kap/db	900	30,0
Távbeszélő készülék	db	1400	1,1
Ikerjelfogó	db	300	0,2
Nyilvános készülék	db	10	0,3
Távbeszélő fülke	db	10	0,1

Alközponti rekonstrukció

CA 42 B VIII/40	db	2	0,7
CA 42 B X/80	db	2	1,0
RA 15	db	3	0,3
RA 8	db	3	0,1

Helyi hálózat rekonstrukció ér.km 4600 16,7

Építés 0,5

Egyéb /Helyközi munkahelyek/ 2,0

Összesen: 53,0 eFt

2./ Kiskunhalas

Belföldi gép

1 db ARF 102-es kont.központ	áll.kap.	900	15,0
Távbeszélő készülék+ikerjelfogó	db	700+50	0,6
Nyilvános készülék	db	10	0,2
Távbeszélő fülke	db	10	0,1

Alközponti rekonstrukció

CA 42 B X/80	db	2	1,0
RA 8	db	2	0,1

Helyi hálózat rekonstrukció ér.km 4500 5,0

Építés 0,2

Egyéb /Helyközi munkahelyek/ 1,3

Összesen: 23,5

A beruházásra vonatkozó műszaki és egyéb előírások:

Baján 2 db VIDÉK II. típusu összesen 1800 állomáskapacitású ARF 102 rendszerű konténerbe szerelt helyi távbeszélő központ létesül. Az országos hálózatba manuálisan csatlakozik zsinoros interközponton keresztül.

Az országos távhívó hálózatba a szegedi ARM központon keresztül csatlakozik a kihelyezett kétirányú félautomata berendezések igénybevételével. A beruházás eredményeként jelentősen javul a helyi és helyközi távbeszélőszolgáltatás minősége. A helyi beszélgetések automatikusan történnek. A bajai főközpontban jelenleg üzemelő 6 db helyközi munkahely kiváltásra kerül, a megnövekedett igényeknek megfelelően 10 db új helyközi munkahely telepítésére kerül sor.

Biztosításra kerül a bejelentő és tudakozó hívások fogadása a jelenleg üzemelő hódmezővásárhelyi rendszerhez hasonlóan.

A konténerközpontokhoz kapcsolódó helyi hálózatrekonstrukció a III,V,VI számú gerincirányok megvalósítását tartalmazza, mintegy 4600 ér km-ben.

Az alközponti rekonstrukció keretében 4 db CA 42 B, 3 db RA 15, és 3 db RA 8 típusú alközpont üzembehelyezése történik meg.

Kiskunhalason 1 db VIDÉK I. típusú 900 állomáskapacitású a bajai rendszerhez hasonló - konténerközpont létesül.

A helyközi forgalom lebonyolításához 8 db intermunkahely telepítése történik meg.

A helyi hálózatrekonstrukció mintegy 4500 érkm létesítését tartalmazza. Az alközponti rekonstrukció keretében 2 db CA 52B, és 2 db RA 8 típusú alközpont üzembehelyezése történik meg.

A beruházást előkészítő, megvalósító és az üzembehelyezést lebonyolító apparátus szervezeti felépítése:

A beruházás előkészítéséért és megvalósításáért kizárólag a beruházói apparátus a felelős.

Tekintettel azonban az előkészítési és megvalósítási idő rendkívüli rövidegére, valamint a beruházás speciális voltára, a megvalósítás egy olyan beruházó - építő - fenntartó együttes tevékenységet kíván, amely bizonyos mértékben megköveteli a szervezeti egységek működési határainak fellazítását. Ezt elsősorban a felkészülési és üzembehelyezési időszakra kell érteni, amikor a meglévő napi feladatok mellé technikailag ujszerű és nagy felelősséggel járó munkákat kell irányítani és végrehajtani, rendkívül szoros határidők betartásával.

A megvalósításban közreműködő szervezet működésének főbb elvei:

- 1./ A szervezet működését a Távközlés Műszaki Igazgatóhelyettes irányítja és ellenőrzi.
- 2./ Létre kell hozni és állandó jelleggel működtetni kell egy bizottságot, amely rendszeresen - előre meghatározott időközönként - ülést tart, és számot ad az elvégzett munkákról, ill. meghatározza a következő időszakban elvégzésre kerülő feladatokat.
A bizottság vezetője a Távközlési Műszaki Igazgatóhelyettes. A bizottság ülésein részt vesz valamennyi érdekelt szerv megbízott képviselője. Minden ülésről írásos anyag készül.
- 3./ A központos terület önálló egységet képez. Feladatát a koncentrációs központok készrejelentésétől az üzembehelyezésig végzi. A központok átvételére külön ütemterv és dokumentáció készül. A központ üzembehelyezéséért külön felelős személy operatív módon irányítja a rendelkezésére bocsájtott apparátust.

A beruházás 1979. szeptember hó 30-i üzembehelyezéséhez a Szegedi Postaigazgatóságnak az alábbi feladatokat kell megoldani:

- 1./ A beruházás megvalósításának teljes időszakában kiemelt szintű koordinációval kell összhangot teremteni:
 - valamennyi érdekelt szakterület között
 - a kivitelezésben résztvevő valamennyi szerv és egység között

Felelős: a Távközlési Műszaki Igazgatóhelyettes

Közreműködő: 8,9,10,11 osztályok vezetői

Határidő: Folyamatos

2./ A beruházás során megvalósuló berendezésekre és a telepítési helyszínre vonatkozó engedélyek beszerzése, megrendelések kiadása, szükséges tervek biztosítása, szerződések megkötése.

Ezen belül:

- a./ Beruházási alapokmány felterjesztése
- b./ Telepítési helyszín kijelölése, kezelői jog megszerzése
- c./ Konténerközpontok megrendelése
- d./ Alközpontok megrendelése /rekonstrukció, táphidas berendezések cseréje/
- e./ Távbeszélő készülékek, /nyilvános készülékek, távbeszélő fülkék megrendelése
- f./ Helyközi munkahelyek megrendelése
- g./ Konténerek telepítésénck tervezése /építészeti, erősáram/
- h./ Hálózatátterhelés tervezésénck megrendelése
- j./ Tervezési és szállítási ill. gyártási szerződések megkötése.

Felelős: 10. Beruházási Osztály vezetője

Közreműködő: 8,9 osztályok vezetője, Területi Tervező Iroda vezetője

Határidő: 1978. július 30.

3./ A Területi Tervező Iroda magasépítési tervezői csoportja által készített kivitelei tervek alapján építési engedély beszerzése, és a telepítési helyszín építészeti kialakítása ill. a konténerközpontokhoz a tervben szereplő erősáramu csatlakozás biztosítása.

Felelős: 10, 11 osztályok vezetői

Közreműködő: -

Határidő: 1979. január 1.

4./ A konténerközpontokhoz csatlakozó, illetve a konténerék közötti hálózat megépítése a TTI tervei alapján.

Felelős: 11 osztály vezetője

Közreműködő: 10. osztály vezetője

Határidő: 1979. március 31.

5./ A konténerközpontok az országos távhívó hálózathoz - manuális munkahelyeken keresztül - kétirányú félautomata berendezésekkel csatlakoznak a szegedi ÁRM központhoz.

Baján és Kiskunhalason a meglévő keret a 10, ill. 8. áramkör fogadására alkalmas - sávbővitéssel -. A jelfogó sávok 1979. II. negyedévben kerülnek leszállításra.

A szegedi ARM központban keretbővítés is szükséges, ami a jelenleg folyó 200-as bővitéssel valósul meg.

Mindkét végen biztosítani kell az FDTR-TV-KE ill. az FDR-TV-Y áramkörök működését.

Felelős: 10. Beruházási osztály vezetője

Közreműködő: 8. osztály vezetője.

Határidő: 1979. július 30.

6./ Biztosítani kell megfelelő számú helyközi áramkört a félautomata berendezések üzemeltetéséhez.

Baja: 10 áramkör

Kiskunhalas: 8 áramkör

Felelős: 8. osztály vezetője

Közreműködő: 9, 10 osztályok vezetői

Határidő: 1979. július 30.

7./ A konténerközpontok készrejelentése előreláthatóan az alábbi ütemezéssel történik:

Baja: 1979. március

Kiskunhalas: 1979. június

Tekintettel arra, hogy a szerződést a BHG a.b. gyár köti, a készrejelentést követően azonnal el kell szállítani a konténereket.

A szállítást megelőzően be kell szerezni a szükséges engedélyeket /utvonalengedély/, a szállítási utvonalat be kell járni, biztosítani kell a szállítás feltételeit, és a szállítást végre kell hajtani.

Felelős: 10. osztály vezetője.

Közreműködik: 5. osztály vezetője /gépkocsi biztosítás/

Határidő: 1979. március

8./ Baján és Kiskunhalason a konténerközpontok telepítésével és üzembehelyezésével párhuzamosan alközponti rekonstrukciót kell végrehajtani, illetve valamennyi táphidas berendezést le kell cserélni.

Felelős: 8, 10 osztályok vezetője

Közreműködik: 9 osztály vezetője

Határidő: 1979. szeptember 30.

9./ A konténerközpontok üzembehelyezésére valamennyi távbeszélő készüléket tárcsás készülékre kell lecserélni.

Bajára: 1400 db.

Kiskunhalasra: 700 db. készülék,

Ezen tulmenően:

Bajára: 300 db., Kiskunhalasra 50db, ikerjelfogó kerül beszerzésre.

A fenti berendezéseket - az igények felmérése után-, a központ üzembehelyezésének időpontjáig fel kell szerelni.

Felelős: 8 osztály vezetője

Közreműködő: 9, 10 osztályok vezetője

Határidő: 1979. szeptember 30.

10./ Mindkét helyen 10-10 db. nyilvános távbeszélő fülke és készülék létesítésére kerül sor.

A távbeszélő fülkék telepítését ill. a nyilvános készülékek felszerelését a konténerközpontok üzembehelyezéséig el kell végezni.

Felelős: 8. 10 osztályok vezetője

Közreműködő: 9, 11 osztályok vezetője

Határidő: 1979. szeptember 30.

11./ Mindkét helyen a jelenleg üzemelő berendezések mellett elő kell készíteni az új helyközi munkahelyek telepítését.

Gondoskodni kell az esetleg szükséges építészeti munkák elvégzéséről.

Mindkét helyen a rendezőt bővíteni kell. El kell készíttetni a rendező vasszerkezetét, be kell szerezni a szükséges szerelvényeket /vill.védő, 6x20-as forrcsucok 20-as "a-b" ágas leválasztósávok/ ezeket fel kell szerelni, illetve a kábeleket ki kell fejtetni.

Felelős: 8, 10 osztályok vezetője

Közreműködik: 11 osztály vezetője

Határidő: 1979. június 30.

12./ A leszállításra kerülő konténerközpontokba a szükséges átkötéseket az Igazgatóságnak kell elvégezni. A központoknál BHG képviselőt nem lesz.

Tekintettel arra, hogy a jelenleg AR tapasztalattal rendelkező szegedi szakembereknek a 200-as bővítés üzembehelyezését kell ebben az időszakban elvégezni, a helyi karbantartó személyzetet fel kell készíteni arra, hogy a szükséges átkötéseket, és a központok üzembehelyezése előtti vizsgálatokat, illetve az üzembehelyezést elvégezze.

Felelős: 8 osztály vezetője

Közreműködő: 10 osztály vezetője

Határidő: Folyamatos

13./ A konténerközpontok telepítése után el kell végezni a szükséges hálózatátterhelési munkákat, oly módon, hogy az üzembehelyezés a lehető legrövidebb idő alatt elvégezhető legyen.

Felelős: 10, 8 osztályok vezetője

Közreműködő: 11 osztály vezetője

Határidő: 1979. szeptember 15.

14./ Az új helyközi munkahelyek kezelése némileg eltér a jelenleg üzemelő munkahelyekétől. Gondoskodni kell a kezelőszemélyzet megfelelő oktatásáról.

Felelős: 9 osztály vezetője

Közreműködő: 10 osztály vezetője

Határidő: 1979. szeptember 15.

15./ A konténerközpontok átvételére ütemtervet kell készíteni, és el kell készíteni az átvételi vizsgálatok tételes leírását, illetve dokumentációját.

Felelős: 10 beruházási osztály vezetője

Közreműködő: 8 osztály vezetője

Határidő: 1979. március 15.

16./ Intézkedni kell a várakozók igényének pontos felmérésére, fontosság szerinti csoportosítására, a várakozó közületek és előfizetők felhívására a belépési díjat illetően.

A felszerelésre kerülő előfizetők számának közlése az üzemenl.

Felelős: 9 osztály vezetője

Határidő: 1979. február 28.

17./ Számkiosztási irányelvek összeállítása, számkiosztás végrehajtása.

Felelős: 9 osztály vezetője

Közreműködő: 10 osztály vezetője /egyenletes forgalmi terhelés biztosítása miatt/

Határidő: 1978. december 31.

18./ Számváltozási jegyzék /új telefonkönyv/ összeállítása, megfelelő példányszámban való biztosítása, szétküldése.

Felelős: 9 osztály vezetője

Határidő: 1979. szeptember 15.

19./ A Posta Központi Magasépítési Üzem által legyártott új helyközi munkahelyek ideiglenes helyen való üzembehelyezése.

Felelős: 10.8 osztályok vezetője

Közreműködik: 9, 11 osztályok vezetője

Határidő: 1979. szeptember 30.

20./ A komplex üzembehelyezés után intézkedni kell a régi munkahelyek leszereléséről, selejtezéséről, az új munkahelyek végleges helyre történő áthelyezéséről, a szükséges kábel szerelési munkák elvégzéséről.

Felelős: 8 osztály vezetője

Határidő: 1979. november 30.

21./ A beruházási számlák helyességének különös gonddal történő ellenőrzése jelentős gazdaságossági tényező. A fentiek miatt a számlák mennyiségi és minőségi ellenőrzésére nagy gondot kell fordítani.

Felelős: 10 osztály vezetője

Határidő: folyamatos

22./ Mivel a beruházás terven felüli keretből valósul meg, a Vezérigazgatóságnak rendszeresen jelenteni kell a beruházás állását, valamint az üzemtervtől való esetleges eltérések részletes indoklását. Nagy hangsúlyt kell fektetni a jelentések határidőre történő elküldésére.

Felelős: 10 osztály vezetője

Határidő: folyamatos

23./ Az üzembehelyezéskor esedékessé váló aktiválást elő kell készíteni. A pénzügyi nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az aktiválás az üzembehelyezés negyedévében megtörténjen.

Felelős: 10 osztály vezetője

Határidő: 1979. október 30.

24./ A beruházással kapcsolatos leltárváltozásnak a pénzügyi aktiválással egyidejűleg, az üzembehelyezés negyedévében kell megtörténnie.

Felelős: 8 osztály vezetője

Határidő: 1979. október 30.

25./ A szervezeti egységek az ütemtervben meghatározott feladataikat a szakmai terület sajátosságaihoz igazodóan további részfeladatokra, határozzák meg a részfeladatok megoldásának módját /ahol ezt a körülmények indokolják,/ elvégzésének határidejét - az ütemterv többi határidejéhez igazodóan-,
Jelöljék ki a részfeladatok elvégzésének felelőseit.


Felelős: Távközlési Műszaki Igazgatóság helyettes

Határidő: 1978. szeptember 30.

Szervezeti egységek

Elvégzendő feladatok az
ütemterv alapján

Távközlés Műszaki Ig.h.	F: 1, 25
10. Beruházási Osztály	F: 2,3,5,7,8,10,11,13,15,19, 21,22,23 K: 1,4,6,9,12,17
8. Távközlési Műszaki Osztály	F: 6,8,9,10,11,12,13,19,20,24 K: 1,2,5,15,
9. Távközlési Forgalmi Osztály	F: 14,16,17,18 K: 1,2,6,8,9,10,19
11. Építési Osztály	F: 3,4 K: 1,10,11,13,19
5. Postaforgalmi Osztály	F: - K: 7

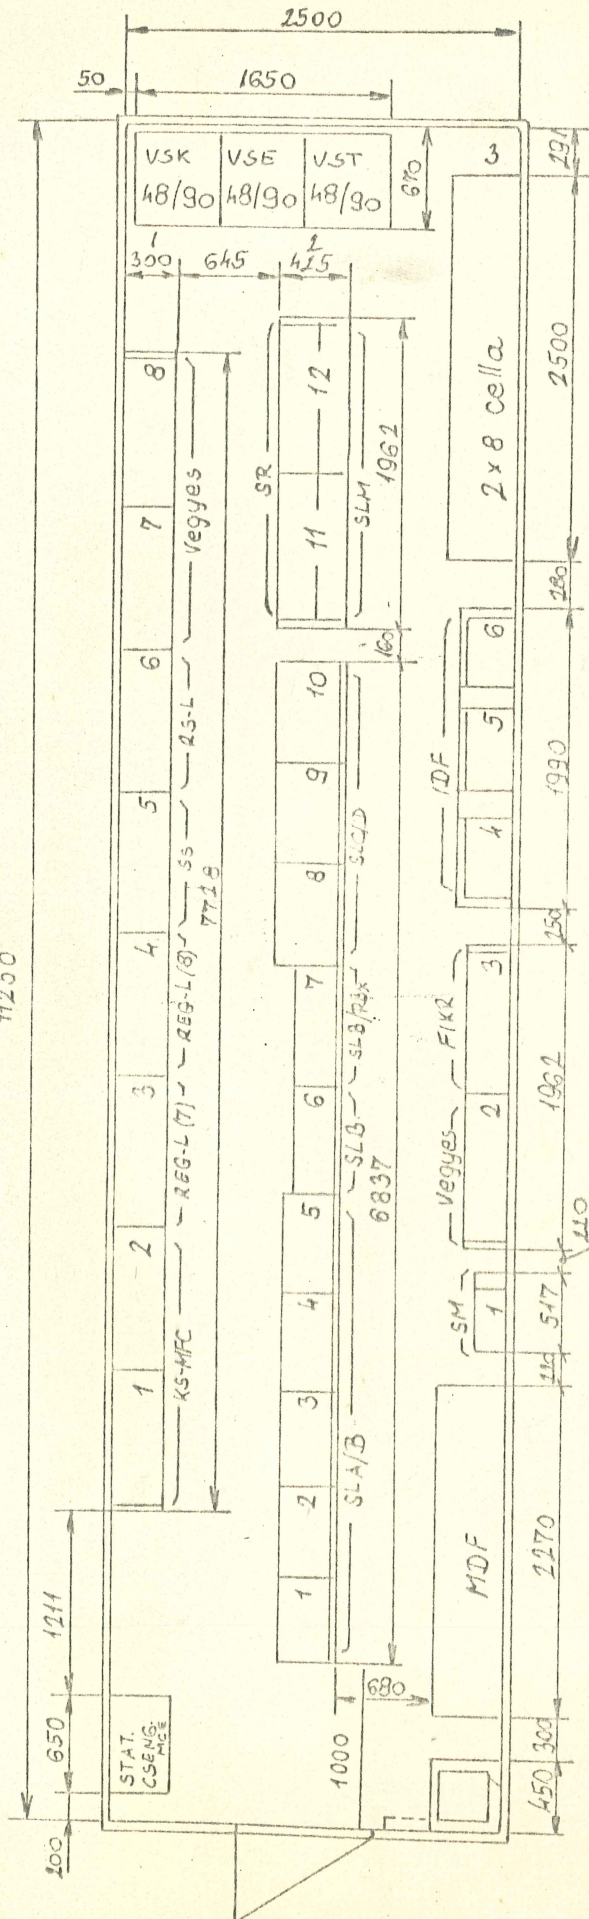

M = 1:50

ZEVPA7A

